

Texas Hold'em

全项目计划书

文档版本 v2.0 · 更新日期 2026-08-24 · 三期精益方案 · 10 周 · 含甘特图

本 PDF 由项目计划书 Markdown 自动生成；甘特图见正文 §6.3

总周期	10 周（合同签署日起）
合同建议价	¥240,000（三期付款；含首季云资源）
第一期	W1 – W3 · ¥72,000 · 接场 + IAP/OAuth Alpha
第二期	W4 – W7 · ¥96,000 · 核心 UI + 压测 + 提审
第三期	W8 – W10 · ¥72,000 · 上线 + 迁移 + 终验

Texas Hold'em 全项目计划书

项目	内容
文档版本	v2.0
更新日期	2026-08-24
项目名称	Texas Hold'em 全球英文区公测上架 (v1.1 · 精益版)
交付模式	全项目外包 (接场现有代码约 80%)
总周期	10 周 (合同签署日起)
项目预算	¥240,000 (三期付款; 含首季云资源)
时间基准	合同签署日 = T0; W1 = 签约后第 1 周
代码基线	cursor/phase4-open-beta-2fc9
权威规格	PRD-完整版-v2.0.md、10-版本范围规划.md

目录

- 1. [执行摘要](#)
- 2. [项目背景与目标](#)
- 3. [战略决策 \(已锁定\)](#)
- 4. [项目范围 \(精益\)](#)
- 5. [组织与资源](#)
- 6. [三期总体计划](#)
- 7. [第一期: 接场与技术启动 \(W1 – W3\)](#)
- 8. [第二期: UI 与上架冲刺 \(W4 – W7\)](#)
- 9. [第三期: 上线与终验 \(W8 – W10\)](#)
- 10. [WBS 工作分解结构](#)
- 11. [里程碑与验收标准](#)
- 12. [三期付款与交付对照](#)
- 13. [预算总览](#)
- 14. [风险登记册](#)
- 15. [KPI 与成功标准](#)
- 16. [假设与约束](#)
- 17. [附录](#)

一、执行摘要

Texas Hold'em 是一款跨端社交竞技德州扑克产品。在 **¥24 万 / 10 周** 精益预算下，本项目目标单一明确：

10 周内完成全球英文区双端上架、真实 IAP 收款、私人场公测全开。

1.1 三期方案一览

期次	时间	核心目标	付款	累计
第一期	W1 – W3	接场、Scope 锁定、Design Token、IAP/OAuth Alpha	¥72,000	¥72,000
第二期	W4 – W7	核心 UI 落地、商店素材、压测、提审	¥96,000	¥168,000
第三期	W8 – W10	正式上线、筹码迁移、终验	¥72,000	¥240,000

1.2 与全量方案对比 (v1.1 → v2.0)

维度	v1.1 全量	v2.0 精益
周期	58 周	10 周
预算	¥101 万	¥24 万
前期调研	独立 6 周	并入 W1 (3 天)
UI	PRD 全量拟物化	核心路径视觉升级
压测	300 CCU	100 CCU 轻量报告
QA	28 人日双轮	12 人日单轮 + 终验
Hypercare	30 天	1 周
运营 / 买量	含 52 周计划	不含 (上架后另议)

1.3 关键判断

维度	结论
可行性前提	代码基线 80% 已完成；预算用于 上架 P0 缺口 而非从零开发
首发市场	全球英文区
私人场	公测即开
筹码迁移	方案 A (清零 + 赠 100)

Gate 规则： W1 末 Scope Matrix 签字 → 设计 / 研发并行启动。

二、项目背景与目标

2.1 背景

- PRD 与核心代码已就绪；缺口集中在 原生 IAP、生产 OAuth、核心 UI、商店上架、轻量压测。
- ¥24 万 / 10 周要求 范围做减法：优先保上架与收款，视觉与运营精细化延后至 v1.1.x 迭代。

2.2 项目目标

#	目标	衡量标准	目标周
G1	范围锁定	Scope Matrix 签字	W1
G2	技术 Alpha	IAP 沙盒 + OAuth 生产	W3
G3	核心 UI 可用	大厅 + 牌桌 + 商城主路径	W6
G4	商店提审	双端提交	W7
G5	正式上线	全球英文区可下载	W9
G6	IAP 生产到账	首笔真实充值	W9
G7	筹码迁移	方案 A 执行完成	W9
G8	项目终验	QA P0=0；付款结清	W10

2.3 不在本项目范围 (Won't)

- 独立前期调研周 (>3 天)
- PRD 全量拟物化动效 / 全屏精细化
- 300 CCU 压测、多区域部署
- v1.5+ 新功能
- 买量、客服人力、52 周运营计划
- ASO 多轮迭代 (仅 1 轮修订)

三、战略决策（已锁定）

#	决策	方案
1	首发市场	全球英文区
2	私人场	公测即开（W9）
3	筹码迁移	方案 A
4	美国买量	不列入 T1（上架后另议）
5	交付模式	外包接场；三期付款
6	预算纪律	¥24 万硬顶；超范围走 CR 另计费

四、项目范围（精益）

4.1 Scope Matrix v1.1 · 精益版

优先级	模块	精益范围	验收
Must	接场审计	Gap 矩阵；P0 清单	W1 签字
Must	原生 IAP	iOS + Android 生产联调	真机到账
Must	生产 OAuth	Apple / Google 真 token	非 dev-mode
Must	核心 UI	大厅、牌桌、商城、引导（非全量拟物化）	主路径可用
Must	商店上架	截图 6 张 + 简版视频；英文文案	可提审
Must	法务	Privacy / ToS / RG（模板 + 修订）	链接可访问
Must	轻量压测	100 CCU；基础容量结论	W6 报告
Must	公测迁移	方案 A 脚本 + 公告	W9 执行
Must	私人场	公测全开 + 冒烟回归	W9
Should	Firebase 漏斗	注册 → 充值 3 事件	W4
Should	Crashlytics	崩溃监控	W3
Won't	全量 PRD 视觉 / 动效	v1.1.x 迭代	—
Won't	300 CCU / 多活	不做	—

4.2 接场基线（已完成 · 不重复计费）

模块	完成度
扑克引擎、官方场、私人场、后台、双榜、合规 API	90–100%
IAP 服务端验单	90%
移动端 UI	功能骨架（需视觉升级）

五、组织与资源

5.1 精简团队

角色	投入	职责
创始人	兼职审批	Sponsor；48h 内签字
PM	0.3 FTE × 10 周	排期、验收、风险
高级研发	1 人 × 8 周	IAP、OAuth、UI 落地、部署
UI 设计	外包	Design Token + 核心页 + 牌桌
QA	0.5 FTE × 4 周	冒烟 + 终验
法务	外包模板	英文三件套

5.2 人力合计（精益）

角色	人日	预算占比
研发	~55	38%
设计 + 商店	~25	22%
QA	~12	6%
法务	~5	8%
DevOps / 云	—	21%
PM + 缓冲	~10	13%
合计	~107 人日	100%

六、三期总体计划

6.1 10 周路线图

W1——W3	W4——W7	W8-W10
第一期	第二期	第三期
接场/IAP	UI/提审	上线
¥7.2万	¥9.6万	¥7.2万

6.2 三期对照总表

期次	周次	周期	核心交付	里程碑	付款
第一期	W1 – W3	3 周	Gap 矩阵、Design Token、IAP/OAuth、Staging	M1–M3	¥72,000
第二期	W4 – W7	4 周	核心 UI、商店素材、100 CCU 压测、提审	M4–M6	¥96,000
第三期	W8 – W10	3 周	上线、迁移、终验	M7–M8	¥72,000

6.3 甘特图

时间基准：T0 = 2026-08-24（合同签署日）。

图 1 · 10 周项目总路线图

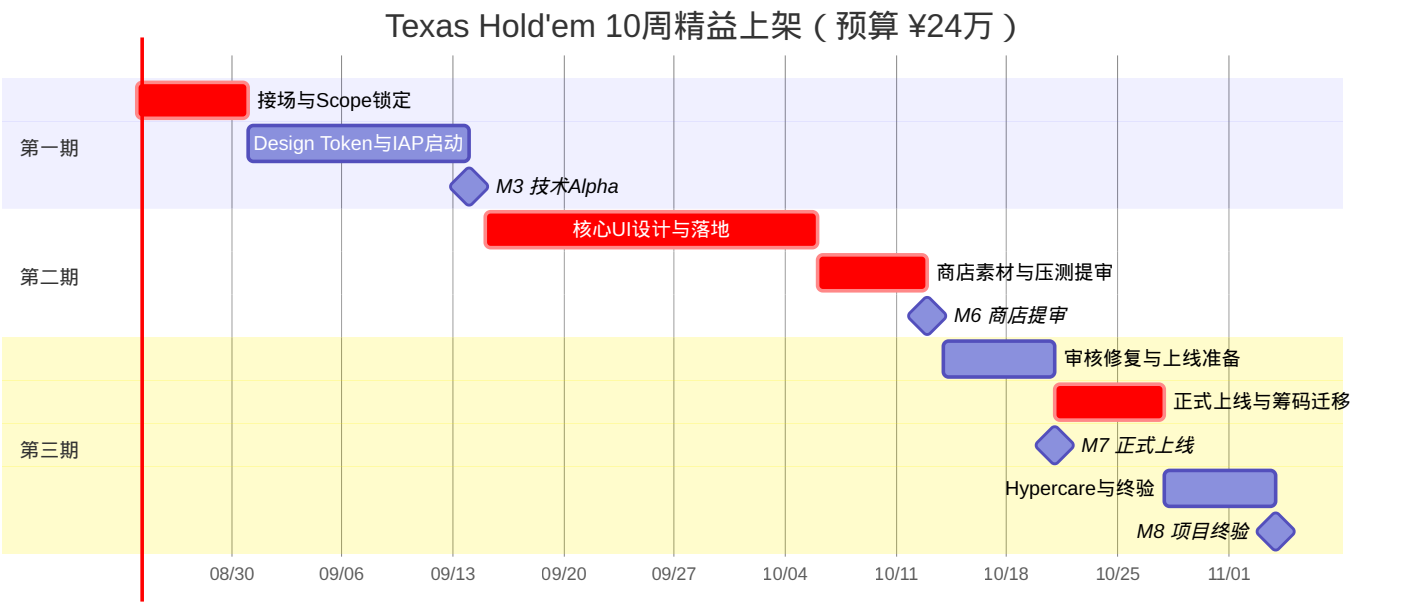


图 2 · 周度任务甘特 (W1 – W10)


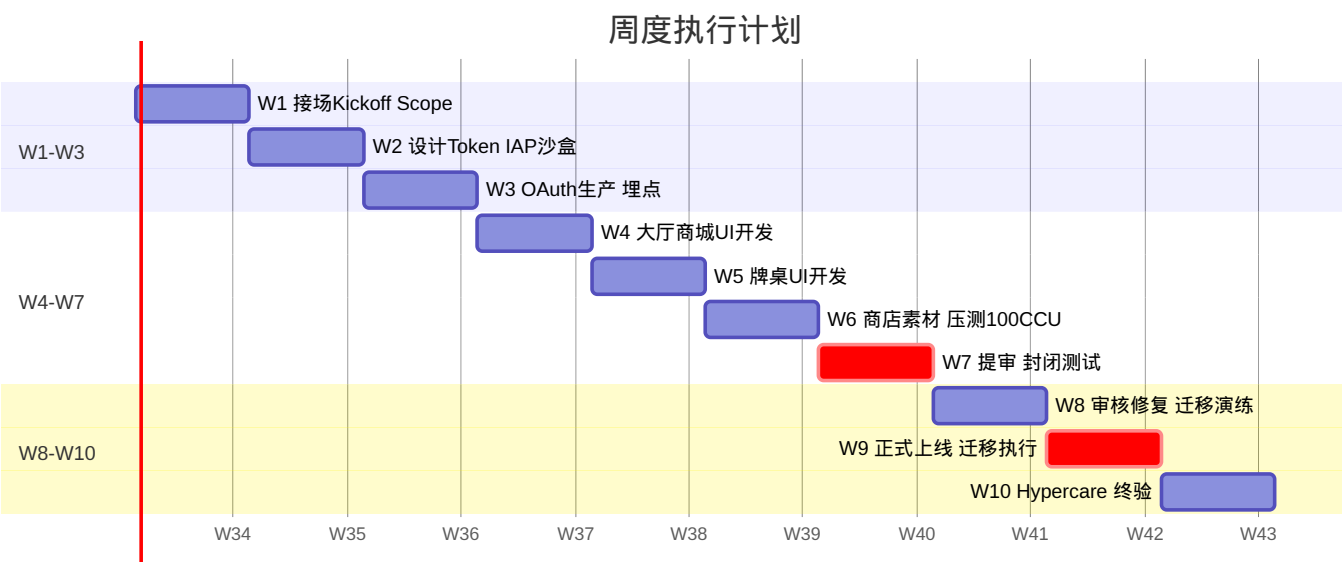


图 3 · 三期付款节点



七、第一期：接场与技术启动 (W1 – W3)

预算：¥72,000 · 付款：W3 验收后

7.1 阶段目标

3 天内完成接场与 Scope 锁定；W3 末 IAP 沙盒 + OAuth 生产可用。

7.2 周度任务

周次	任务	交付物
W1	接场 kickoff; 快速 Scope 评审 (PRD 已有)	Gap 矩阵; Scope Matrix 签字
W1	设计启动; 法务模板选型	Figma 项目; 法务合同
W1	Staging 环境搭建	Staging URL
W2	Design Token + 核心页线稿	Token 文档; 大厅 / 商城框架
W2	IAP 沙盒联调 (iOS + Android)	沙盒 E2E 录像
W2	App 图标	商店 + App 内图标
W3	生产 OAuth 验签	真 token 登录
W3	Firebase 核心事件 + Crashlytics	3 个漏斗事件
W3	清档脚本 Staging 演练	方案 A 演练记录
W3	第一期验收	验收报告

7.3 交付物

#	交付物	验收
D1-01	Gap 矩阵 + Scope Matrix	创始人签字
D1-02	Design Token + 核心页线稿	评审通过
D1-03	IAP 沙盒 E2E	双端各 1 笔
D1-04	OAuth 生产可用	非 dev-mode
D1-05	Staging 环境	72h 稳定

八、第二期：UI 与上架冲刺（W4 – W7）

预算：¥96,000 · 付款：W7 验收后

8.1 阶段目标

核心 UI 代码落地；商店素材齐备；100 CCU 压测；W7 双端提审。

8.2 周度任务

周次	任务	交付物
W4	大厅 / 商城 / 设置 UI 落地	Staging 可体验
W4	牌桌 UI 设计定稿	Figma 牌桌稿
W5	牌桌 UI 代码落地	Table 主路径可用
W5	弹窗 / 引导 / 破产流程	核心弹窗完成
W6	商店截图 6 张 + 简版视频	可提审素材包
W6	英文 Privacy / ToS / RG 初稿	法务评审
W6	100 CCU 轻量压测	容量报告
W6	生产环境部署	Prod 环境 + 基础监控
W7	QA 冒烟（官方场 + 私人场 + IAP）	P0 = 0
W7	iOS + Android 提审	提审回执
W7	TestFlight / Play 内测 30 人	内测反馈清单
W7	第二期验收	验收报告

8.3 交付物

#	交付物	验收
D2-01	核心 UI（大厅 + 牌桌 + 商城）	主路径无 P0
D2-02	商店截图 + 视频 + 英文文案	可用于提审
D2-03	《100 CCU 压测报告》	无致命瓶颈
D2-04	生产环境 + 监控	API / Room 可用
D2-05	提审回执	已提交
D2-06	QA 冒烟报告	P0 = 0

九、第三期：上线与终验（W8 – W10）

预算：¥72,000 · 付款：W10 终验后

9.1 阶段目标

W9 全球发布；方案 A 迁移；1 周 Hypercare；W10 项目 closure。

9.2 周度任务

周次	任务	交付物
W8	审核反馈修复（如有）	修复版本
W8	法务终稿上线	三件套 URL
W8	迁移公告 T-7；生产演练	公告文案
W9	全球英文区正式上线	商店可下载
W9	私人场全开	回归确认
W9	方案 A 筹码迁移执行	迁移日志
W9	生产 IAP 首笔验证	对账记录
W10	UI / 商店 1 轮修订（如有）	修订记录
W10	QA 终验 + Hypercare 报告	P0 = 0
W10	项目终验	终验报告 + 签字

9.3 交付物

#	交付物	验收
D3-01	上线公告 + 商店链接	双端可下载
D3-02	筹码迁移执行记录	脚本成功
D3-03	生产 IAP 首笔	到账确认
D3-04	法务终稿	链接有效
D3-05	QA 终验报告	P0 = 0
D3-06	《项目终验报告》	创始人签字

十、WBS 工作分解结构

1. Texas Hold'em v1.1 精益上架 [¥240,000 · 10周]
├─ 1.1 第一期 W1-W3 [¥72,000]
│ ├─ 1.1.1 接场审计 + Scope
│ ├─ 1.1.2 Design Token + 图标
│ ├─ 1.1.3 IAP 沙盒 + OAuth 生产
│ ├─ 1.1.4 Staging + Crashlytics + 埋点
│ └─ 1.1.5 清档脚本演练
├─ 1.2 第二期 W4-W7 [¥96,000]
│ ├─ 1.2.1 核心 UI 设计与落地
│ ├─ 1.2.2 商店素材 + 法务初稿
│ ├─ 1.2.3 100 CCU 压测 + Prod 部署
│ ├─ 1.2.4 QA 冒烟
│ └─ 1.2.5 商店提审
└─ 1.3 第三期 W8-W10 [¥72,000]
├─ 1.3.1 审核修复 + 法务终稿
├─ 1.3.2 正式上线 + 筹码迁移
├─ 1.3.3 Hypercare 1 周
└─ 1.3.4 终验 + Closure

十一、里程碑与验收标准

里程碑	时间	通过条件	付款
M1 接场	W1	Gap + Scope 签字	—
M2 设计启动	W2	Design Token 评审	—
M3 技术 Alpha	W3	IAP 沙盒 + OAuth 生产	¥72,000
M4 核心 UI	W6	大厅 + 牌桌 + 商城可用	—
M5 压测	W6	100 CCU 报告	—
M6 提审	W7	双端已提交	¥96,000
M7 上线	W9	商店可下载；私人场全开	—
M8 终验	W10	QA P0=0；文档齐全	¥72,000

十二、三期付款与交付对照

期次	金额	占比	验收周	核心交付
第一期	¥72,000	30%	W3	D1-01 ~ D1-05
第二期	¥96,000	40%	W7	D2-01 ~ D2-06
第三期	¥72,000	30%	W10	D3-01 ~ D3-06
合计	¥240,000	100%		

付款节点：验收通过后 5 个工作日内。

十三、预算总览

类别	金额	期次	说明
接场审计 + Scope	¥10,000	第一期	W1
IAP / OAuth / 埋点 / 清档	¥45,000	第一—二期	技术冲刺
UI 设计（核心）	¥32,000	第一—二期	Token + 牌桌
UI 落地（核心路径）	¥40,000	第二期	研发
商店素材	¥15,000	第二期	截图 + 简版视频
法务合规（模板）	¥18,000	第二—三期	英文三件套
QA（精简）	¥14,000	第二—三期	冒烟 + 终验
DevOps + 部署	¥12,000	第一—二期	Staging + Prod
PM + 项目管理	¥12,000	全程	10 周
不可预见费	¥14,000	全程	审核驳回等
云资源 + SaaS（首季）	¥38,000	第一—三期	含在总包内
合计	¥240,000		硬顶

13.1 不含在 ¥24 万内

- 用户买量、客服人力
- v1.1.x 视觉精修、ASO 第 2 轮起
- 300 CCU 全量压测
- IAP 流水平台抽成（15%—30%）

十四、风险登记册

ID	风险	概率	影响	应对
R01	¥24 万不够覆盖全 PRD 视觉	高	高	Scope 精益版；精修走 v1.1.x CR
R02	10 周无法过审	中	高	W7 提审；W8 预留修复；法务模板前置
R03	IAP 联调超时	中	高	W2 启动；第一期专款
R04	牌桌 UI 压缩过度	中	中	W5 创始人评审；仅保主路径
R05	创始人签字延迟	中	中	48h SLA；逾期顺延不计供应商责任
R06	商店审核驳回	中	高	不可预见费 ¥1.4 万；W8 修复

十五、KPI 与成功标准

15.1 项目成功定义（W10）

- 1. App Store + Google Play 可下载
- 2. 生产 IAP 首笔到账
- 3. 私人场全开；冒烟回归通过
- 4. 方案 A 迁移执行完成
- 5. QA 终验 P0 = 0
- 6. ¥24 万三期付款结清

15.2 上架后指标（参考，非本项目交付）

指标	上架后 30 天参考
累计注册	500 – 2,000
D7 留存	≥ 10%
Crash-free	≥ 99%

十六、假设与约束

16.1 假设

- 1. 代码基线 phase4-open-beta-2fc9 无 P0 架构缺陷
- 2. 创始人 W1 完成 Scope 签字；里程碑 48h 内批复
- 3. Apple / Google 账号与 IAP 商品配置由甲方提供
- 4. PRD 全量拟物化不在 ¥24 万范围内

16.2 约束

- 1. 预算硬顶 ¥240,000
- 2. 周期硬顶 10 周（自 T0 起）
- 3. 设计修订每阶段 ≤1 轮
- 4. 压测上限 100 CCU

十七、附录

附录 A：文档索引

文档	路径
产品 PRD	docs/PRD-完整版-v2.0.md
全量版计划书（对照）	Git 历史 v1.1
商业化启动计划书	docs/11-商业化启动计划书.md

附录 B：签字页

角色	姓名	签字	日期
项目 Sponsor (创始人)			
项目经理			

签字即表示认可 **¥24 万 / 10 周 / 三期** 精益范围，并授权 **W1** 启动。

本文档 v2.0 为精益上架方案；全量 58 周 / ¥101 万方案见 Git 历史 v1.1。
