

Texas Hold'em

全项目计划书

文档版本 v1.1 · 更新日期 2026-08-20 · 四期方案 · 58 周 · 含甘特图

本 PDF 由项目计划书 Markdown 自动生成；甘特图见正文 §6.3

总周期	58 周（前期 6 周 + 执行 / 运营 52 周）
合同建议价	¥1,010,000（四期付款）
第零期	W-6 – W-1 · ¥98,000 · 调研 + 计划书
第一–三期	W1 – W12 · ¥912,000 · 接场 → 上线 → 终验

Texas Hold'em 全项目计划书

项目	内容
文档版本	v1.1
更新日期	2026-08-20
项目名称	Texas Hold'em 全球英文区公测上架（v1.1）
交付模式	全项目外包（接场现有代码约 80%）
总周期	58 周（前期 6 周 + 执行 / 运营 52 周）
合同建议价	¥1,010,000（四期付款；不含买量）
时间基准	合同签署日 = T0；W-6 = T0 第 1 周
代码基线	cursor/phase4-open-beta-2fc9
权威规格	PRD-完整版-v2.0.md、10-版本范围规划.md

目录

- 1. [执行摘要](#)
- 2. [项目背景与目标](#)
- 3. [战略决策（已锁定）](#)
- 4. [项目范围](#)
- 5. [组织与资源](#)
- 6. [四期总体计划](#)
- 7. [第零期：前期调研与产品设计（W-6 – W-1）](#)
- 8. [第一期：接场与上架冲刺（W1 – W4）](#)
- 9. [第二期：开发与设计峰值（W5 – W8）](#)
- 10. [第三期：上线与稳定（W9 – W12）](#)
- 11. [运营期计划（W13 – W52）](#)
- 12. [WBS 工作分解结构](#)
- 13. [里程碑与验收标准](#)
- 14. [四期付款与交付对照](#)
- 15. [预算总览](#)
- 16. [风险登记册](#)
- 17. [KPI 与成功标准](#)
- 18. [沟通与治理机制](#)
- 19. [假设与约束](#)
- 20. [附录](#)

一、执行摘要

Texas Hold'em 是一款跨端（iOS / Android / Web）社交竞技德州扑克产品，采用单向封闭筹码经济。本项目目标是在 58 周内完成：

- 1. 前期调研与产品设计（6 周）
- 2. 全球英文区 App Store / Google Play 上架（v1.1 公测）
- 3. 真实 IAP 收款与私人场全开
- 4. 首年稳态运营（自然量 → T1 买量验证 → 稳态）

1.1 四期方案一览

期次	时间	核心目标	付款	累计
第零期	W-6 – W-1	调研、Scope Matrix、Wireframe、本计划书定稿	¥98,000	¥98,000
第一期	W1 – W4	接场、设计规范、IAP/OAuth、Staging	¥300,000	¥398,000
第二期	W5 – W8	牌桌 UI、压测、商店提审	¥370,000	¥768,000
第三期	W9 – W12	正式上线、终验、Hypercare	¥242,000	¥1,010,000

1.2 关键判断

维度	结论
产品定位	社交竞技德州扑克，娱乐筹码，非真钱博彩
变现	IAP 充值（主）+ 官方场 5% / 私人场 3% rake
技术现状	核心玩法与私人场 已完成 ；缺口在原生 IAP、UI 落地、压测、上架
首发市场	全球英文区（English U.S. 主语言）
私人场	公测即开 ，强风控 + 后台熔断
首年 KPI（保守）	注册 5–10 万 · MAU 8,000–15,000 · 付费率 3–5%

Gate 规则： 第零期《项目计划书》创始人签字 → 方可启动第一期 W1。

二、项目背景与目标

2.1 背景

- 产品 PRD v2.0 与经济模型已设计完成，代码仓库 `phase4-open-beta-2fc9` 约 **80%** 达到 v1.1 要求。
- 当前移动端为**功能骨架**，距 PRD 拟物化视觉仍有差距；IAP 服务端验单已有，客户端需接原生 StoreKit / Play Billing。
- 战略方向已锁定：**全球英文区首发、私人场公测即开、方案 A 筹码迁移**、美国不做 T1 买量。

2.2 项目目标（SMART）

#	目标	衡量标准	目标日期
G1	完成前期调研与范围锁定	Scope Matrix 签字	W-3
G2	完成拟物化 UI 设计 + 落地	Figma 评审 + 核心路径视觉一致	W8
G3	全球英文区双端上架	App Store + Google Play 可下载	W9
G4	真实 IAP 端到端到账	生产环境首笔充值成功	W9
G5	压测与容量达标	300 CCU 报告；P99 开局 ≤5s	W7
G6	公测筹码迁移执行	方案 A 脚本执行；用户确认率 ≥95%	W9 前
G7	软启动验证留存	D7 留存 ≥12%；Crash-free ≥99.5%	W20
G8	T1 买量验证单位经济	LTV/CPI ≥0.7 或按纪律停投	W32

2.3 不在本项目范围（Won't）

- v1.5 功能（GTO Bot、好友、成就 CMS、多盲注）
- v2.0 Web 支付（Stripe / USDC）
- 美国专项合规律师（如需单独立项）
- 用户买量预算（另计 ¥180,000/年）
- 客服人力（仅含工具 SaaS）

三、战略决策（已锁定）

#	决策	方案	计划书执行要点
1	首发市场	全球英文区	商店页 English (U.S.); 应用内 en-US + zh-CN
2	私人场	公测即开	W9 上线时全开; Admin 保留一键暂停
3	筹码迁移	方案 A	T-14 预告 → T-7 弹窗 → T-0 清零 + 赠 100
4	美国买量	不列入 T1	UAC / Meta 定向排除 US; M10+ 再评估
5	交付模式	全项目外包	接场代码; 四期付款; PM + 独立 QA
6	设计	UI + 商店素材外包	三期设计交付嵌入第一 / 二 / 三期

四、项目范围

4.1 Scope Matrix v1.1


优先级	模块	范围说明	验收
Must	原生 IAP (iOS + Android)	StoreKit / Play Billing 生产联调	真机到账
Must	生产 OAuth	Apple / Google ID Token 验签	非 dev-mode
Must	拟物化 UI	大厅、牌桌、商城、弹窗、引导	Figma 一致
Must	商店上架	双端提审通过; Privacy / ToS / RG 链接	审核通过
Must	压测	300 CCU; 容量报告	P99 ≤5s 开局
Must	公测迁移	方案 A 清档 + 确认弹窗	脚本 + 公告
Must	私人场	公测全开 + 举报 / 熔断 / 2 人限制	回归通过
Must	运营后台	用户详情、经济看板、系统配置	三板斧可用
Must	数据分析	Firebase 注册 → 充值漏斗	漏斗可查
Should	ASO 迭代	商店素材 2-3 轮修订	第三期
Should	Crashlytics + CI/CD	发版流水线	W4 前
Won't	GTO Bot / 好友 / 成就	v1.5 再议	—
Won't	Facebook OAuth	延后	—
Won't	多区域多活	首年单区域	—

4.2 接场基线（已完成 · 不重复开发）

模块	完成度
扑克引擎 + 单测	100%
官方 9 人场 + Room WS + 断线重连	100%
私人场全套 + 举报 + chip dumping	100%
IAP 服务端验单 + 商品目录	90%
双榜 + 隐身 + 18+ + 自我封禁	100%
运营后台	95%
公测迁移确认 API	100%（生产脚本待做）

五、组织与资源

5.1 项目组织架构

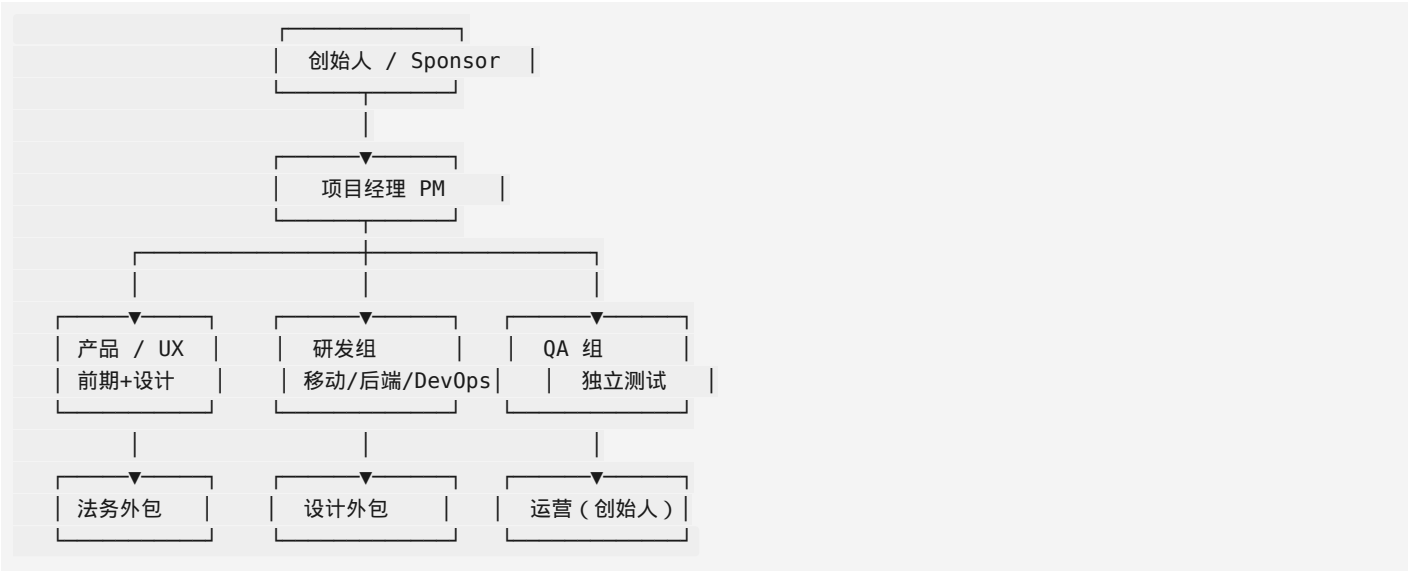

5.2 角色与职责（RACI 摘要）

工作项	创始人	PM	产品/UX	研发	QA	设计外包	法务
Scope Matrix 签字	A	R	R	C	I	C	C
项目计划书签字	A	R	C	C	C	I	I
IAP 生产联调	C	A	I	R	R	I	I
UI 设计评审	A	R	C	C	I	R	I
商店提审	A	R	C	R	C	C	C
公测迁移执行	A	R	C	R	R	I	I
买量决策	A	C	C	I	I	I	I

R=执行 · A=审批 · C=咨询 · I=知会

5.3 人力投入（审慎估算）

角色	第零期	第一-三期	运营期	合计人日
产品 / UX	25	15	10	50
高级研发	5	164	20	189
QA	—	28	15	43
PM	8	40	20	68
设计外包	—	45	10	55
合计	38	292	75	~405 人日

六、四期总体计划

6.1 58 周路线图

W-6——W-1	W1——W4	W5——W8	W9——W12	W13——W20	W21——W32	W33——W52
第零期	第一期	第二期	第三期	软启动	买量验证	稳态
调研规划	接场冲刺	设计开发	上线终验			
¥9.8万	¥30万	¥37万	¥24.2万			

6.2 四期对照总表

期次	周次	周期	核心交付	里程碑	付款
第零期	W-6 – W-1	6 周	调研报告、Scope Matrix、Wireframe、本计划书	M0	¥98,000
第一期	W1 – W4	4 周	Gap 矩阵、Design Token、IAP/OAuth Alpha、Staging	M1–M3	¥300,000
第二期	W5 – W8	4 周	牌桌 UI、商店素材、压测报告、提审	M4–M6	¥370,000
第三期	W9 – W12	4 周	正式上线、QA 终验、Hypercare、云 SaaS	M7–M8	¥242,000

6.3 甘特图

时间基准：T0 = 2026-08-20（合同签署日）；横轴为日历周。

图 1 · 58 周项目总路线图（四期 + 运营）

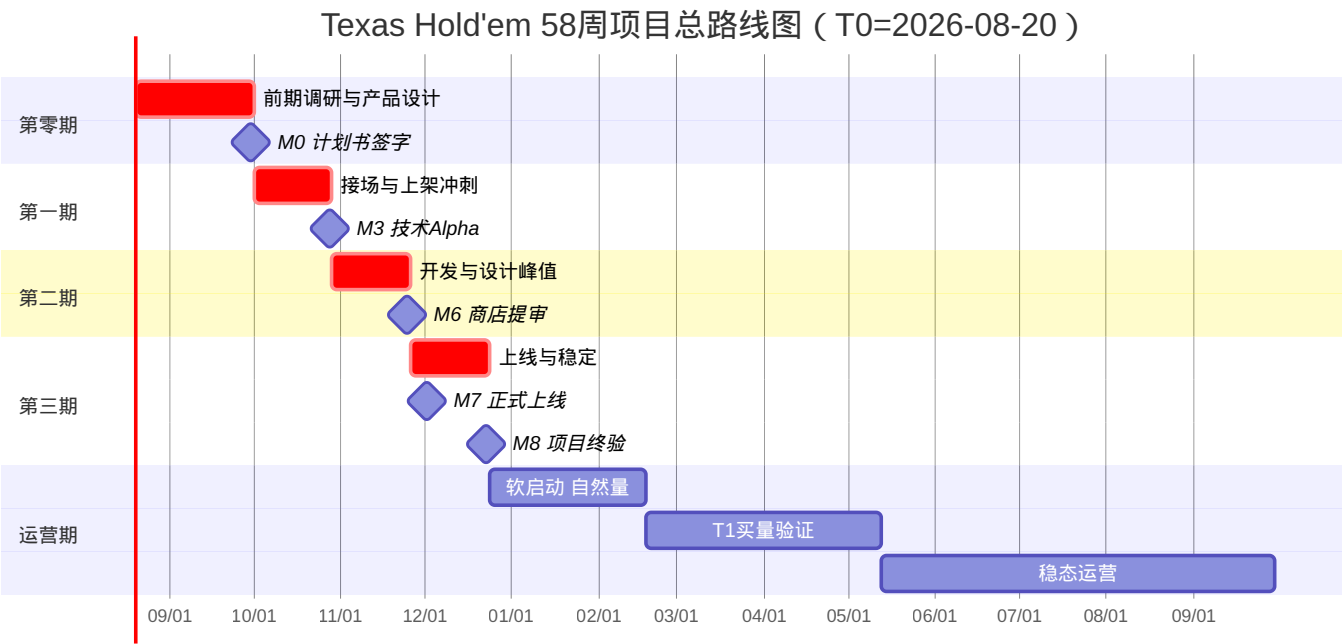


图 2 · 第零期周度甘特 (W-6 – W-1)

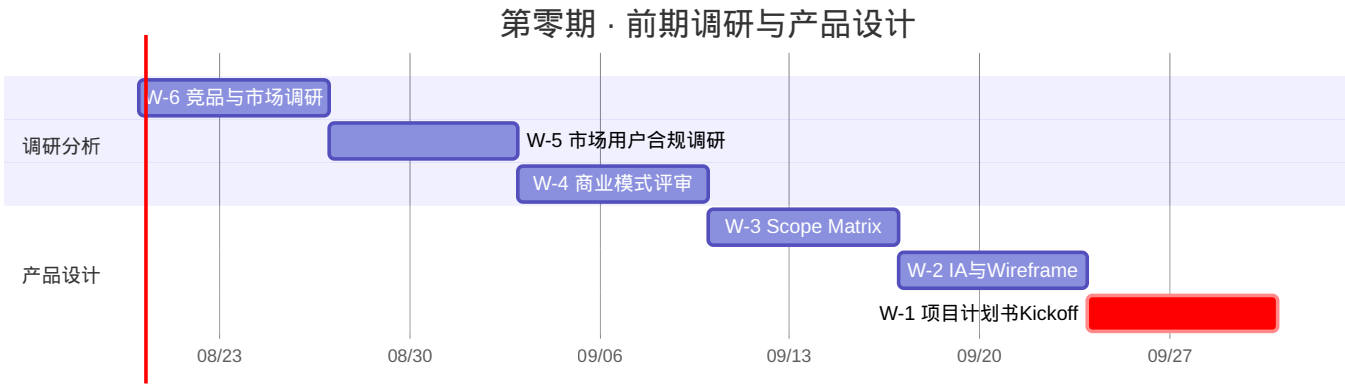


图 3 · 执行期甘特 (W1 – W12 · 第一至三期)

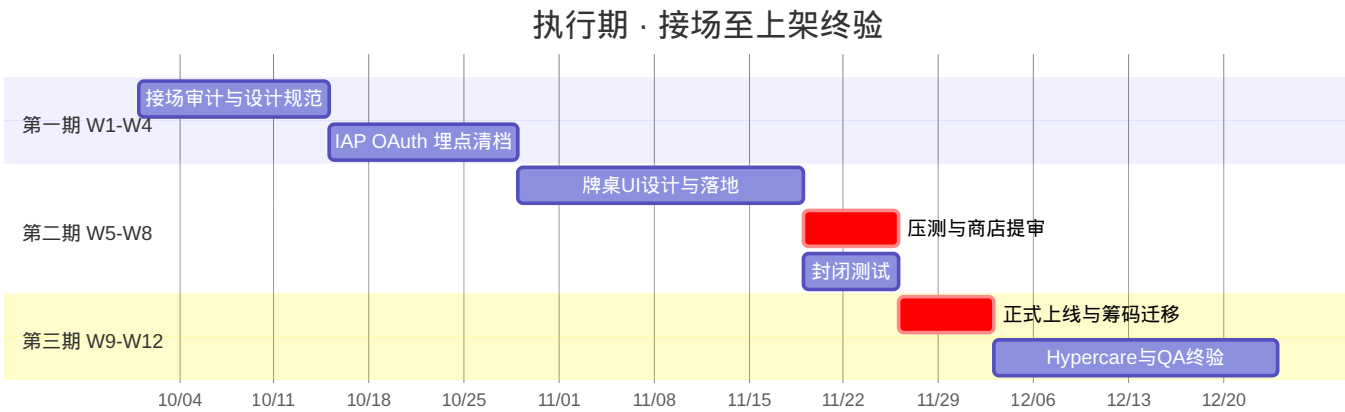


图 4 · 四期付款里程碑



七、第零期：前期调研与产品设计 (W-6 – W-1)

预算：¥98,000 · 付款：第零期整期验收后 5 个工作日内

7.1 阶段目标

锁定 v1.1 范围，输出可执行的 58 周计划，完成核心路径 Wireframe，本计划书定稿并签字。

7.2 周度任务计划

周次	任务	交付物	负责人	验收标准
W-6	竞品与市场调研 kickoff	《调研计划》；竞品清单 ≥8 款	产品顾问	PM 审核通过
W-5	市场 / 用户 / 合规调研	《市场定位草案》；T1/T2 策略表；合规边界 memo	产品 + 法务	创始人评审
W-4	商业模式评审	《经济模型表》；rake / IAP / 首充假设；LTV 框架	产品	数值逻辑自治
W-3	PRD 梳理与范围锁定	《Scope Matrix v1.1》；Must/Should/Won't	产品 + 技术	创始人签字
W-2	产品设计与 IA	《信息架构图》；Wireframe ≥12 屏	UX	核心路径覆盖完整
W-1	项目计划书评审与 Kickoff	《全项目计划书》定稿；风险登记；资源计划；Kickoff 纪要	PM	创始人签字 → 进入 W1

7.3 第零期交付物清单

#	文档 / 产出	格式	必须
D0-01	《前期调研报告》（含竞品分析）	PDF / MD	✓
D0-02	《Scope Matrix v1.1》	表格	✓
D0-03	《信息架构与 Wireframe》	Figma / PDF	✓
D0-04	《经济模型与单位经济假设》	表格	✓
D0-05	《全项目计划书》（本文档定稿版）	MD / PDF	✓
D0-06	《风险登记册》初版	表格	✓
D0-07	Kickoff 纪要 + 签字页	PDF	✓

7.4 第零期退出标准（Gate to 第一期）

- ☐ Scope Matrix 创始人签字
- ☐ Wireframe 覆盖：注册 → 首局 → 充值 → 私人场开房
- ☐ 本计划书创始人签字
- ☐ 供应商合同 / SOW 就绪

八、第一期：接场与上架冲刺（W1 – W4）

预算：¥300,000（含云 SaaS 预提 ¥80,000）· 付款：W4 里程碑验收后

8.1 阶段目标

完成接场审计，交付设计规范与核心页视觉，IAP / OAuth 达到 Alpha，Staging 环境可用。

8.2 周度任务计划

周次	任务	交付物	工作包
W1	接场 kickoff；开发 / 设计合同；账号开通	Gap 矩阵 v0.9；Figma 项目；Apple/Google 账号；Staging 启动	WP0, WP5
W1	法务启动	Privacy / ToS / RG 撰写启动	WP7
W2	设计第一期验收	Design Token；大厅 / 商城 / 设置 / 引导页；App 图标	WP3-P1
W2	接场审计完成	Gap 矩阵 定稿；测试计划	WP0
W3	原生 IAP 沙盒联调	iOS + Android 沙盒 E2E	WP1
W3	生产 OAuth	Apple / Google 真 token 验签	WP1
W3	Firebase 漏斗	注册 → 首局 → 充值事件	WP1
W4	CI/CD + Crashlytics	发版流水线；崩溃监控	WP1, WP5
W4	公测清档脚本	方案 A 脚本 + Staging 演练	WP1
W4	第一期里程碑评审	第一期验收报告	PM

8.3 第一期交付物清单

#	交付物	验收
D1-01	《Gap 矩阵》定稿	与 Scope Matrix 一致
D1-02	Design Token + 核心页 Figma	设计评审通过
D1-03	App 图标（商店 + App 内）	导出 @2x/@3x
D1-04	IAP 沙盒 E2E 演示录像	iOS + Android 各 1 笔
D1-05	OAuth 生产验签通过	非 dev-mode 登录
D1-06	Staging 环境 URL + Runbook	API / Room / Admin 可访问
D1-07	Firebase 漏斗 Dashboard	3 个核心事件
D1-08	方案 A 清档脚本（Staging 演练）	演练记录

8.4 第一期退出标准

- ☐ M1 接场签字
- ☐ M2 设计一期评审通过
- ☐ M3 技术 Alpha（IAP 沙盒 + OAuth 生产）
- ☐ Staging 环境稳定 72h

九、第二期：开发与设计峰值（W5 – W8）

预算：¥370,000 · 付款：W8 里程碑验收后

9.1 阶段目标

牌桌 UI 设计 + 代码落地，商店素材齐备，压测通过，双端提交审核。

9.2 周度任务计划

周次	任务	交付物	工作包
W5	设计第二期启动	9 人牌桌 UI；弹窗 / 空状态	WP3-P2
W5	牌桌 UI 代码落地（启动）	Table9Max 视觉重构	WP2
W5	商店截图 + 视频	6 张截图 + 30s 视频 + 英文描述	WP3-P2
W6	牌桌 UI + 切图包交付	Redline + @1x/@2x/@3x 资源	WP3-P2, WP2
W6	后端加固	对账视图；限流；私人场熔断联调	WP4
W6	QA 第一轮	官方场 + 私人场 + IAP 沙盒	WP6
W7	压测 300 CCU	《容量报告》；P99 指标	WP1
W7	生产环境部署	Prod API / Room；监警告警	WP1, WP5
W7	全球英文区提审	iOS + Android 并行提交	—
W8	封闭测试	TestFlight / Play 内测 50 人	—
W8	私人场回归	举报 / 熔断 / 2 人限制	WP6
W8	第二期里程碑评审	第二期验收报告	PM

9.3 第二期交付物清单

#	交付物	验收
D2-01	9 人牌桌 Figma + 切图包	Redline 完整
D2-02	牌桌 / 弹窗 UI 代码 (Staging)	无 P0 布局缺陷
D2-03	商店截图 + 预览视频 + 英文文案	可用于提审
D2-04	《300 CCU 压测报告》	P99 开局 ≤5s
D2-05	生产环境 + 监控 Dashboard	Uptime 告警可用
D2-06	App Store / Play 提审回执	已提交
D2-07	QA 第一轮报告	P0 = 0

9.4 第二期退出标准

- ☐ M4 设计二期 + 商店素材齐备
- ☐ M5 压测通过
- ☐ M6 双端已提审
- ☐ QA 第一轮 P0 清零

十、第三期：上线与稳定 (W9 – W12)

预算：¥242,000 (含云 SaaS 余款 ¥104,320) · 付款：W12 终验后

10.1 阶段目标

全球英文区正式发布，方案 A 筹码迁移执行，30 天 Hypercare，QA 终验，项目 closure。

10.2 周度任务计划

周次	任务	交付物	工作包
W9	正式上线	全球发布；私人场全开	—
W9	公测迁移 T-0	方案 A 脚本执行；赠 100 筹码	WP1
W9	IAP 生产首充验证	生产环境首笔 IAP 到账	WP1
W10	UI 联调修订 (第 1 轮)	设计第三期交付	WP2, WP3-P3
W10	ASO 素材迭代	商店页修订 (如有审核反馈)	WP3-P3
W11	公测反馈 UI 迭代	用户反馈修复	WP2
W11	法务终稿	Privacy / ToS / RG 定稿上线	WP7
W12	QA 终验	全路径回归；P0 = 0	WP6
W12	Hypercare 结束	30 天运维报告	PM
W12	项目终验	终验报告 + Closure	PM

10.3 第三期交付物清单

#	交付物	验收
D3-01	上线公告 + 商店链接	双端可下载
D3-02	方案 A 迁移执行记录	用户确认率 ≥95%
D3-03	生产 IAP 对账记录	首周充值笔数可查
D3-04	UI / ASO 迭代记录	≥1 轮修订
D3-05	法务三件套终稿 URL	官网 / App 内可访问
D3-06	QA 终验报告	P0 = 0; P1 有 workaround
D3-07	Hypercare 报告	Crash-free ≥99.5%
D3-08	《项目终验报告》	创始人签字

10.4 第三期退出标准

- ☐ M7 商店上线 + 私人场全开
- ☐ M8 终验 + Hypercare 结束
- ☐ 四期付款全部结清

十一、运营期计划（W13 – W52）

运营期预算不含在 ¥101 万技术总包内；买量另计 ¥180,000/年。

11.1 Phase 4 软启动（W13 – W20）

目标	指标
累计注册	2,000 – 5,000
付费用户	60 – 150
D7 留存	≥ 12%
Crash-free	≥ 99.5%
买量	¥0

周次	动作
W13 – W16	Reddit / Discord 社群；Product Hunt；ASO 关键词监控
W17 – W20	漏斗周报；首充 / rake 配置微调；商店评分回复

11.2 Phase 5 买量验证（W21 – W32）

周次	动作	预算
W21 – W24	加拿大 + 澳洲 + 新西兰 UAC / Meta	¥43,200
W25 – W28	LTV / CPI 分析；素材优化	（含上）
W29 – W32	ROI ≥0.7 则维持；<0.6 则停投	（含上）

出口标准：ARPPU ≥ ¥58 · 付费率 ≥3% · LTV/CPI ≥0.7

11.3 Phase 6 稳态运营（W33 – W52）

月份	重点	月买量上限
M9 – M10	维持 ROI 正渠道	¥22,800
M11 – M12	筹备 v1.5（好友、成就 CMS）	¥22,800

首年 KPI (M12)：注册 5–10 万 · MAU 8,000–15,000 · 月流水 ¥7.2–14.4 万

十二、WBS 工作分解结构

1. Texas Hold'em v1.1 全项目
└─ 1.0 第零期 前期调研与产品设计 [¥98,000]
└─└─ 1.0.1 竞品与市场调研
└─└─ 1.0.2 商业模式与经济模型
└─└─ 1.0.3 Scope Matrix
└─└─ 1.0.4 IA + Wireframe
└─└─ 1.0.5 项目计划书 + 风险登记
└─ 1.1 第一期 接场与上架冲刺 [¥300,000]
└─└─ 1.1.1 接场审计 (WP0)
└─└─ 1.1.2 设计规范 + 核心页 (WP3-P1)
└─└─ 1.1.3 IAP/OAuth/埋点/清档 (WP1)
└─└─ 1.1.4 Staging + CI/CD (WP5)
└─└─ 1.1.5 法务启动 (WP7)
└─ 1.2 第二期 开发与设计峰值 [¥370,000]
└─└─ 1.2.1 牌桌 UI 设计 + 落地 (WP3-P2, WP2)
└─└─ 1.2.2 商店素材 (WP3-P2)
└─└─ 1.2.3 压测 + 生产部署 (WP1, WP5)
└─└─ 1.2.4 后端加固 (WP4)
└─└─ 1.2.5 QA 第一轮 (WP6)
└─└─ 1.2.6 商店提审
└─ 1.3 第三期 上线与稳定 [¥242,000]
└─└─ 1.3.1 正式发布 + 筹码迁移
└─└─ 1.3.2 UI/ASO 迭代 (WP3-P3, WP2)
└─└─ 1.3.3 法务终稿 (WP7)
└─└─ 1.3.4 QA 终验 (WP6)
└─└─ 1.3.5 Hypercare 30 天
└─└─ 1.3.6 云 + SaaS 首年
└─ 1.4 运营期 W13–W52 [买量另计 ¥180,000]
└─└─ 1.4.1 软启动
└─└─ 1.4.2 T1 买量验证
└─└─ 1.4.3 稳态运营

十三、里程碑与验收标准

里程碑	时间	期次	通过条件	付款触发
M0 前期完成	W-1	第零期	调研 + Scope + 计划书签字	¥98,000
M1 接场	W1	第一期	Gap 矩阵签字	—
M2 设计一期	W2	第一期	Design Token + 核心页	—
M3 技术 Alpha	W4	第一期	IAP 沙盒 + OAuth 生产	¥300,000
M4 设计二期	W6	第二期	牌桌 UI + 商店素材	—
M5 压测	W7	第二期	300 CCU 报告	—
M6 提审	W7	第二期	双端提交	¥370,000
M7 上线	W9	第三期	商店可下载；私人场全开	—
M8 终验	W12	第三期	QA P0=0；Hypercare 结束	¥242,000

十四、四期付款与交付对照

期次	金额	占比	核心交付物	验收文档
第零期	¥98,000	10%	调研报告、Scope Matrix、Wireframe、计划书	D0-01 ~ D0-07
第一期	¥300,000	30%	Gap 矩阵、Design Token、IAP Alpha、Staging	D1-01 ~ D1-08
第二期	¥370,000	37%	牌桌 UI、商店素材、压测报告、提审回执	D2-01 ~ D2-07
第三期	¥242,000	24%	上线、迁移、终验、Hypercare、云 SaaS	D3-01 ~ D3-08
合计	¥1,010,000	100%		

付款节点：里程碑验收通过后 5 个工作日内。

十五、预算总览

类别	金额（人民币）	期次归属
前期调研 + 产品规划	¥98,000	第零期
接场 + 技术冲刺 + DevOps	¥184,000	第一–三期
移动端 UI 落地	¥192,000	第一–三期
设计 + 商店素材	¥108,000	第一–三期
后端加固 + QA	¥74,000	第一–三期
法务合规	¥60,000	第一–三期
PM + 不可预见费	¥112,000	第一–三期
研发类小计	¥828,000	
云 + SaaS 首年	¥184,320	第一 + 三期
技术总包	¥1,010,000	
买量（另计）	¥180,000	W21–W52
首年全口径（含买量）	¥1,190,000	

十六、风险登记册

ID	风险	概率	影响	应对	责任人	期次
R01	前期 Scope 蔓延	中	高	Scope Matrix 锁定；CR 流程	PM	第零期
R02	接场 Gap 超预期	中	高	W1 审计；不可预见费	技术负责人	第一期
R03	IAP 真机联调失败	中	高	WP1 含 4 人日缓冲	研发	第一期
R04	9 人桌 UI 超工时	高	中	WP2 含 6 人日缓冲	设计+研发	第二期
R05	商店审核驳回	中	高	法务前置；Hypercare 修复	PM	第二–三期
R06	私人场合合规事故	低	极高	回归 + 后台熔断	创始人	第三期
R07	筹码迁移客诉	中	中	方案 A 7 天公告 + 确认弹窗	创始人	第三期
R08	买量 LTV/CPI 不达标	中	中	纪律：LTV/CPI <0.6 停投	创始人	W21+
R09	供应商交付质量	中	高	四期付款 + 验收清单	PM	全程
R10	创始人审批延迟	中	中	固定评审会；48h 响应 SLA	创始人	全程

十七、KPI 与成功标准

17.1 分期 KPI

阶段	时间	KPI	目标
第零期	W-1	文档签字完成率	100%
第一—三期	W12	上架 + IAP 生产	双端上线；首笔 IAP
软启动	W20	D7 留存 / Crash-free	≥12% / ≥99.5%
买量验证	W32	LTV/CPI	≥0.7 或停投
稳态	W52	MAU / 付费率	8,000–15,000 / 3–5%

17.2 项目成功定义

本项目（第一—三期）视为成功，当且仅当：

- W9 全球英文区双端可下载，私人场全开
- W9 生产 IAP 首笔到账
- W12 QA 终验 P0 = 0
- W12 Hypercare 期间 Crash-free ≥99.5%
- 四期验收文档齐全、付款结清

十八、沟通与治理机制

18.1 例会节奏

会议	频率	参与者	输出
日站会（执行期）	每日 15min	研发 + QA + PM	阻塞项
周例会	每周	全员 + 创始人	周报、风险更新
里程碑评审	每期末	创始人 + PM + 负责人	验收报告
月度运营复盘	W13 起每月	创始人 + 运营	漏斗 / ROI 报告

18.2 变更控制

变更类型	审批	流程
Scope 内 bug 修复	PM	直接修复
Scope 内 1 轮设计修订	创始人	邮件确认
Scope 外新功能	创始人	CR 文档 + 报价补充
里程碑延期 >3 天	创始人	书面说明 + 赶工计划

十九、假设与约束

19.1 假设

- 合同 T0 起 6 周内完成第零期，不延期启动 W1
- 创始人 48h 内完成里程碑签字
- 代码基线 phase4-open-beta-2fc9 无重大架构缺陷
- Apple / Google 开发者账号由甲方提供
- 首发全球英文区；私人场公测即开
- 筹码迁移采用方案 A

19.2 约束

- 首年单区域部署（无多活）

- 2. 设计每阶段修订 ≤2 轮
- 3. 第零期未完成不得启动 W1
- 4. 买量预算独立于 ¥101 万技术包

二十、附录

附录 A：文档索引

文档	路径
产品 PRD	docs/PRD-完整版-v2.0.md
版本范围规划	docs/10-版本范围规划.md
商业化启动计划书	docs/11-商业化启动计划书.md
全项目外包技术报价书	docs/local/全项目外包技术报价书.md
费用明细（自研对照）	docs/local/开发费与服务器软件费用明细清单.md

附录 B：签字页

角色	姓名	签字	日期
项目 Sponsor（创始人）			
项目经理			
产品负责人			
技术负责人			

签字即表示认可本计划书范围、四期方案、58 周排期及里程碑定义，并授权进入 **W1 第一期** 执行。

本文档为 *Texas Hold'em* 全项目外包四期方案的正式项目计划书；与《全项目外包技术报价书》v1.1 配套使用。
